

LINEA PLENA j.d.o.o.
Šetalište Bačvice 8, 21000 Split
OIB: 78208453247
IBAN: HR17 2360000 1102872895

Oznaka projekta: 179-PE-05/22

Investitor:

Vododvod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.
126 brigade Hrvatske vojske 13
21230 Sinj

**PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA
VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM
KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD –
„PODVORNICE 3-4“**

IZVEDBENI PROJEKT

Split, svibanj, 2022.

Investitor:

*Vododvod i odvodnja Cetinske
krajine d.o.o.
126 brigade Hrvatske vojske 13
21230 Sinj*

Građevina:

**PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME
IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA
PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD – „PODVORNICE 3-4“**

Razina projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

Vrsta projekta:

PROMETNI ELABORAT

Oznaka projekta:

179-PE-05/22

Projektant:

Jure Granić, dipl.ing.prom.



Datum:

svibanj, 2022.

Direktor:

Jure Granić,dipl.ing.prom.

SADRŽAJ PROJEKTA

1. OPĆA DOKUMENTACIJA

1.1.	Naslovna stranica	1
1.2.	Potpisna stranica	2
1.3.	Sadržaj projekta.....	3
1.4.	Izvadak iz sudskog registra	5
1.5.	Imenovanje projektanta.....	7
1.6.	Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera prometa	8

2. TEKSTUALNI DIO PROJEKTA

2.1.	Tehnički opis.....	10
------	--------------------	----

3. GRAFIČKI PRILOZI

3.1.	Privremena regulacija prometa Etapa 1	15
3.2.	Privremena regulacija prometa Etapa 2	16
3.3.	Privremena regulacija prometa Etapa 3	18
3.4.	Privremena regulacija prometa Etapa 3	19
3.5.	Predmjer prometnih znakova i opreme.....	20

1. OPĆA DOKUMENTACIJA



TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Tt-20/2599-2

MBS: 060419313
EUID: HRSR.060419313
Datum: 15.06.2020

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

(prilog uz rješenje)

Fod brojem upisa 1 za tvrtku LINEA PLENA j.d.o.o. za projektiranje i nadzor upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:

LINEA PLENA j.d.o.o. za projektiranje i nadzor

LINEA PLENA j.d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

Split (Grad Split)
Šetalište Bačvice 8

PRAVNI OBLIK:

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

PRETEŽITA DJELATNOST:

71.12 - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

PREDMET POSLOVANJA:

- * - projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
- * - energetska certificiranje, energetski pregled zgrada i redoviti pregled sustava grijanja i sustava građenja ili klimatizacije u zgradi
- * - stručni poslovi prostornog uređenja
- * - djelatnost prostornog uređenja i gradnje
- * - djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
- * - djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * - djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * - projektiranje opreme pratećih objekata i prometne signalizacije
- * - vještačenje u cestovnom prometu
- * - procjena vozila
- * - posredovanje u prometu nekretninama
- * - poslovanje nekretninama
- * - poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * - kupnja i prodaja robe
- * - pružanje usluga u trgovini
- * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * - zastupanje inozemnih tvrtki
- * - usluge informacijskog društva
- * - turističke usluge u nautičkom turizmu
- * - turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- * - turističke usluge u kongresnom turizmu
- * - turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- * - turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi

D002, 2020-06-15 09:09:46

Stranica: 1 od 3



TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Tt-20/2599-2

MBS: 060419313
EUID: HRSR.060419313
Datum: 15.06.2020

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku LINEA PLENA j.d.o.o. za projektiranje i nadzor upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- * - šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- * - usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * - usluge turističkog konjenja
- * - usluge iznajmljivanja opreme za sport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- * - prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * - prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * - prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * - prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * - pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluge smještaja
- * - pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

Jure Granić, OIB: 19320459200
Split, Domovinskog rata 36
- jedini član j.d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Jure Granić, OIB: 19320459200
Split, Domovinskog rata 36
- član uprave
- direktor, zastupa Društvo samostalno i neograničeno

TEMELJNI KAPITAL:
10,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:
Izjava o osnivanju Društva od 9. lipnja 2020.

U Splitu, 15. lipnja 2020.

S U D A C
Franka Buzov

D002, 2020-06-15 09:09:46

Stranica: 2 od 3

179-PE-05/22

Split, 09.svibnja 2022.

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) donosim sljedeće

RJEŠENJE

Jure Granić, dipl. ing.prom. imenuje se za projektanta na izradi Elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na kanalizacijskim kolektorima podsustava Glavice zapad – „Podvornice 3-4“.

Obrazloženje:

Jure Granić, dipl.ing.prom. upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta, čime je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer cestovnog prometa“.

Prema navedenom imenovani ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19).

DIREKTOR:

Jure Granić, dipl.ing.prom.



HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

POTVRDA
o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera
tehnologije prometa i transporta

Ime i prezime: Jure Granić, dipl. ing.

Strukovni razred inženjera cestovnog prometa

Broj iz Imenika: 098

Ovom Potvrdom se dokazuje da gore navedeni ispunjava uvjete propisane Zakonom o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta te je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta. Potvrda se izdaje na rok od 6. mjeseci od datuma izdavanja.

Predsjednik Upravnog odbora

prof. dr. sc. Dragap Peraković



U Zagrebu, 20. rujna 2021.

Dostaviti:

1. Jure Granić
2. Arhiva

Kušlanova 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska – OIB: 16358697738 – Ž.R.: HR53 2360 0001 1020 3775 6
www.hkitpt.hr – email: tajnistvo@hkitpt.hr

2. TEKSTUALNI DIO PROJEKTA

2.1. TEHNIČKI OPIS

Predmet ovog projekta je privremena regulacija za vrijeme izvođenja radova na kanalizacijskim kolektorima podsustava Glavice zapad – „Podvornice 3-4“.

Građevinski radovi obuhvaćaju iskop kanala, polaganje cijevi, nasipanje kanala i asfaltiranje.

Izvođenje radova podijeljeno je u 4 (četiri) etape.

Etapa 1 obuhvaća područje u dužini od cca 130 m. Radovi se izvode u ulici Puškarica II, od raskrižja s lokalnom cestom LC67038 u smjeru juga. Tijekom izvođenja radova zabraniti će se promet za sva vozila osim vozila gradilišta područjem izvođenja radova.

Etapa 2 obuhvaća područje u dužini od cca 1000 m od završetka Etape 1. Tijekom izvođenja radova zabraniti će se promet za sva vozila osim vozila gradilišta područjem izvođenja radova.

Etapa 3 obuhvaća područje u dužini od cca 140 m. Radovi se izvode u ulici Vučinovići, od raskrižja s lokalnom cestom LC67038 u smjeru sjevera. Tijekom izvođenja radova zabraniti će se promet za sva vozila osim vozila gradilišta područjem izvođenja radova.

Etapa 4 obuhvaća područje u dužini od cca 220 m. Radovi se izvode u ulici Dinarine, od raskrižja s lokalnom cestom LC67038 u smjeru sjevera. Tijekom izvođenja radova zabraniti će se promet za sva vozila osim vozila gradilišta područjem izvođenja radova.

Izvođač odnosno investitor radova dužni su poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti i zaštite svih sudionika u prometu koji se koriste javnim prometnim površinama u području izvođenja radova. Javne prometne površine moraju se propisno označiti i osvijetliti noću i u uvjetima smanjene vidljivosti.

U području izvođenja radova potrebno je do vraćanja kolnika u početno stanje preko rova na ulazu/izlazu iz dvorišta stambenih i poslovnih objekata postaviti čelične ploče koje mogu izdržati osovinsko opterećenje od 100 kN.

TEHNIČKI ELEMENTI VOĐENJA PROMETA KOD PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Prometni znakovi i oznake na kolniku se postavljaju prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/1, 92/19).

Prometni znakovi su raspoređeni na osnovi razmatranja čimbenika koji utječu na uvjete odvijanja prometa (brzina, horizontalna i vertikalna preglednost ceste, rang prometnice).

Primijenjeni znakovi su sljedećih dimenzija:

- znakovi oblika trokuta dimenzija 90X90X90 cm
- okrugli znakovi promjera 60 cm
- znakovi oblika kvadrata dimenzija 60X60 cm
- dopunske ploče dimenzija 60X30 cm

Prometni znakovi postavljaju se na prenosiva postolja.

Stupovi nosači prometnih znakova su čelični promjera \varnothing 63,5 mm, zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja.

Ukoliko postoji mogućnost, znakovi se mogu postaviti i na postojeće stupove.

Ukoliko se ipak neki znak postavlja poput trajnog znaka, postavlja se na čelične stupove promjera 63.5 mm. Temelj stupova izvesti od betona C 20/25 u obliku krnje piramide s gornjom stranicom kvadrata od 30 cm, donjom od 40 cm i visinom 70 cm. Znakove zakrenuti za 3-5 stupnjeva u odnosu na os prometnice zbog smanjenja refleksije i to tako da najistaknutija točka znaka bude udaljena 50 cm, a ako to nije moguće minimalno 30 cm od ruba kolnika. Znakovi se postavljaju na visini od 0.30 do 2.20 m.

OGRADA GRADILIŠTA

Obuhvat gradilišta uz središnju razdjelnu crtu u Etapi 1 mora se ograditi betonskim elementima K 24 (New Jersey) i gradilišnom ogradom sa ostalih strana, tako da se spriječi prolazak neovlaštenih osoba na gradilište, a isto tako i radnika s gradilišta na javno – prometnu površinu.


U ostalim etapama, obuhvat gradilišta mora biti ograđen gradilišnom ogradom sa svih strana, tako da se spriječi prolazak neovlaštenih osoba na gradilište, a isto tako i radnika s gradilišta na javno – prometnu površinu.

Ograda se postavlja na način da potpuno obuhvati područje gradilišta na sigurnoj udaljenosti od područja rada/iskopa.

Ograda je pokretnog tipa, sastavljena od panela pocinčanih okvira dimenzija cca 350 x 200 cm, sa zavarenim žicama u uzdužnom i poprečnom smjeru koje formiraju oka dimenzije cca 25 x 10 cm.

Alternativno, ograda može biti i od istegnutog metala, sličnih dimenzija kao gore (visina min. 200 cm).

Elementi ograde postavljaju se na betonske ili gumene podloške.

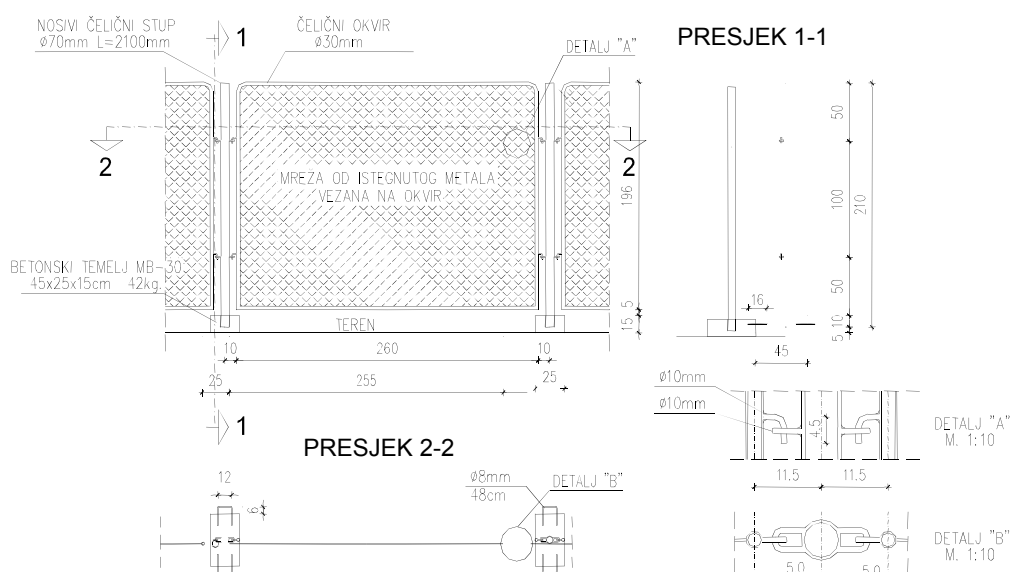

Slika. Detalj zaštitne ograde

- **OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O RADOVIMA**

Izvođač radova obavezan je u lokalnim javnim medijima objaviti datum početka radova, trajanje radova i uputu o privremenoj regulaciji prometa.

- **MJERE ZAŠTITE NA RADU**

Prije početka stupanja na snagu privremene regulacije prometa prema opisanom rješenju, Izvođač radova dužan je postaviti svu privremenu prometnu signalizaciju prema projektu.

Nakon postavljanja privremene prometne signalizacije, a prije početka radova i početka nove regulacije prometa, istu treba prekriti do početka važenja nove regulacije.

Oprema izvoditelja radova, osiguranje strojeva i alata te radnika mora u cijelosti odgovarati propisima tehničke zaštite.

Strojevi, vozila i radnici moraju biti obilježeni odgovarajućim oznakama i znakovima uz obaveznu uporabu boja koje imaju reflektirajuća svojstva.

Kod izvođenja radova u zoni odvijanja prometa svi radnici na gradilištu obavezno moraju biti opremljeni odgovarajućim prslucima sa reflektirajućim oznakama. Ukoliko se pojavi potreba za ručnom regulacijom prometa u nekom kratkotrajnom i specifičnom trenutku izvođenja radova (dostava materijala, strojeva i sl.), radnici moraju biti opremljeni odgovarajućim oznakama za ručno upravljanje prometom, prema važećem Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. To mogu biti odgovarajuće zastavice crvene i zelene boje veličine najmanje 40x40 cm, ili okrugla svjetlosna ploča promjera minimalno 20 cm koja na jednoj strani ima crveno polje s bijelim rubom širine 6 cm, a na drugoj strani zeleno polje s bijelim rubom širine 6 cm. Ručnu regulaciju prometa obavezno provode dva radnika na gradilištu.

Vozači koji se vozilom sa gradilišta uključuju na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom dužni su zaustaviti vozilo i ukloniti blato sa kotača.

Za provedbu mjera privremene regulacije prometa i zaštite na radu prema ovom projektu odgovorni su izvođač radova i nadzorni inženjer gradilišta.

ZAKLJUČAK

Kod izrade prometnog rješenja i postave prometne signalizacije korišteni su Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11,92/19) i Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/19).

Osim navedenih Pravilnika korišteni su:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19)
2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 98/14, 64/15,108/17,70/19)
3. Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 80/13, 148/13, 92/14)
4. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
5. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
6. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, 2001.

Da bi se moglo pristupiti regulaciji prometa u skladu s ovim projektom, neophodno je u potpunosti dovršiti postavljanje svih njome predviđenih znakova za privremeno reguliranje prometa.


Izvođač radova je također dužan nakon završetka radova ukloniti svu privremenu prometnu signalizaciju postavljenu prema ovom projektu i prometnicu dovesti u stanje kao prije početka radova.

Sve radove koji se nisu mogli predvidjeti ovim projektom, a tijekom izvođenja radova se pokažu nužnim, moguće je izvesti samo uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera gradilišta.


Projektant:

Jure Granić, dipl.ing.prom.

3. GRAFIČKI PRILOZI

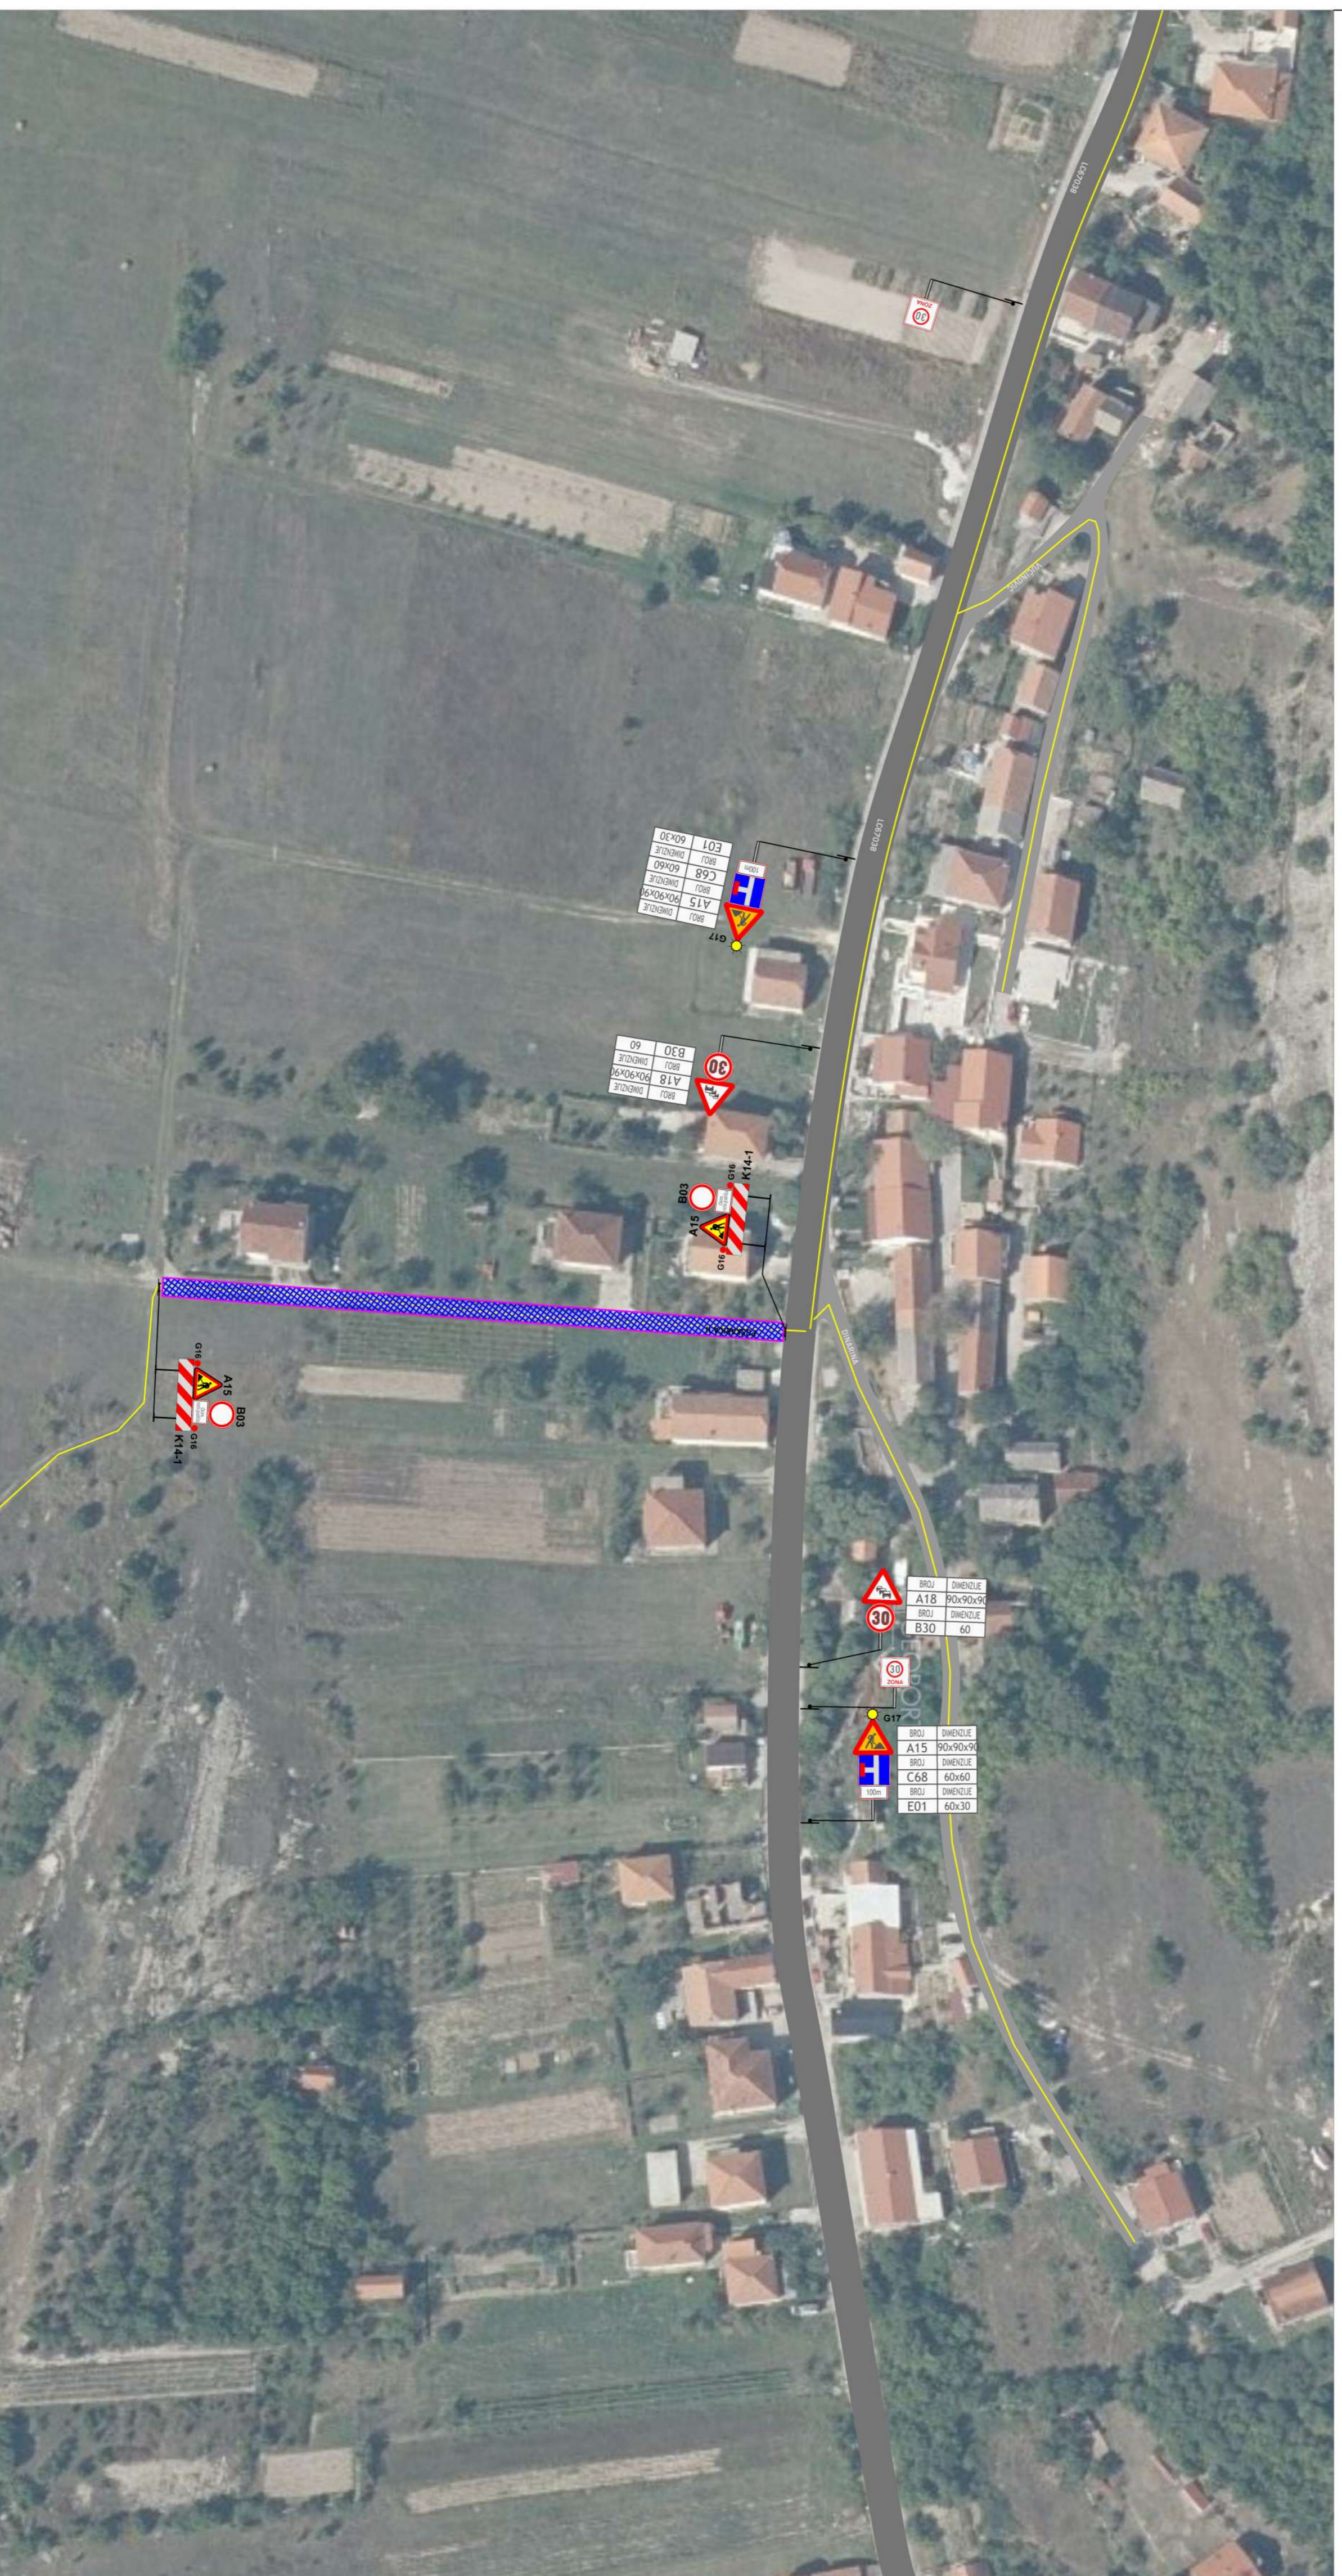

LINEA PLEMA J.d.o.o. Sesalje Bačvice 8 21000 Split		OIB: 78208453247 IBAN: HR17 2360000 1102929995	
INVESTITOR:	Vodovod i odvodnja četinske krajine d.o.o.	OSNOVNA PROJEKTA:	179-PE-09/22
GRABERNIK:	1356, trgovačka društva 1356, trgovačka društva OIB: 61859582389	ZOP:	
PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"	SPOSREDAVAJ: Situacija privremene regulacije prometa Etapa 1	PRVA PROJEKTA:	PROMETNI ELABORAT
PROJEKTANT:	Jure Granić dipr. ing. prom.	RAZINA PROJEKTA:	IZVEŠENJE
SPOSREDAVAJ:		MERLO:	1:1000
		CRTEŽ:	3.1.
		DATA:	svibanj, 2022
		KONTROLIRAO:	
		M.P.:	

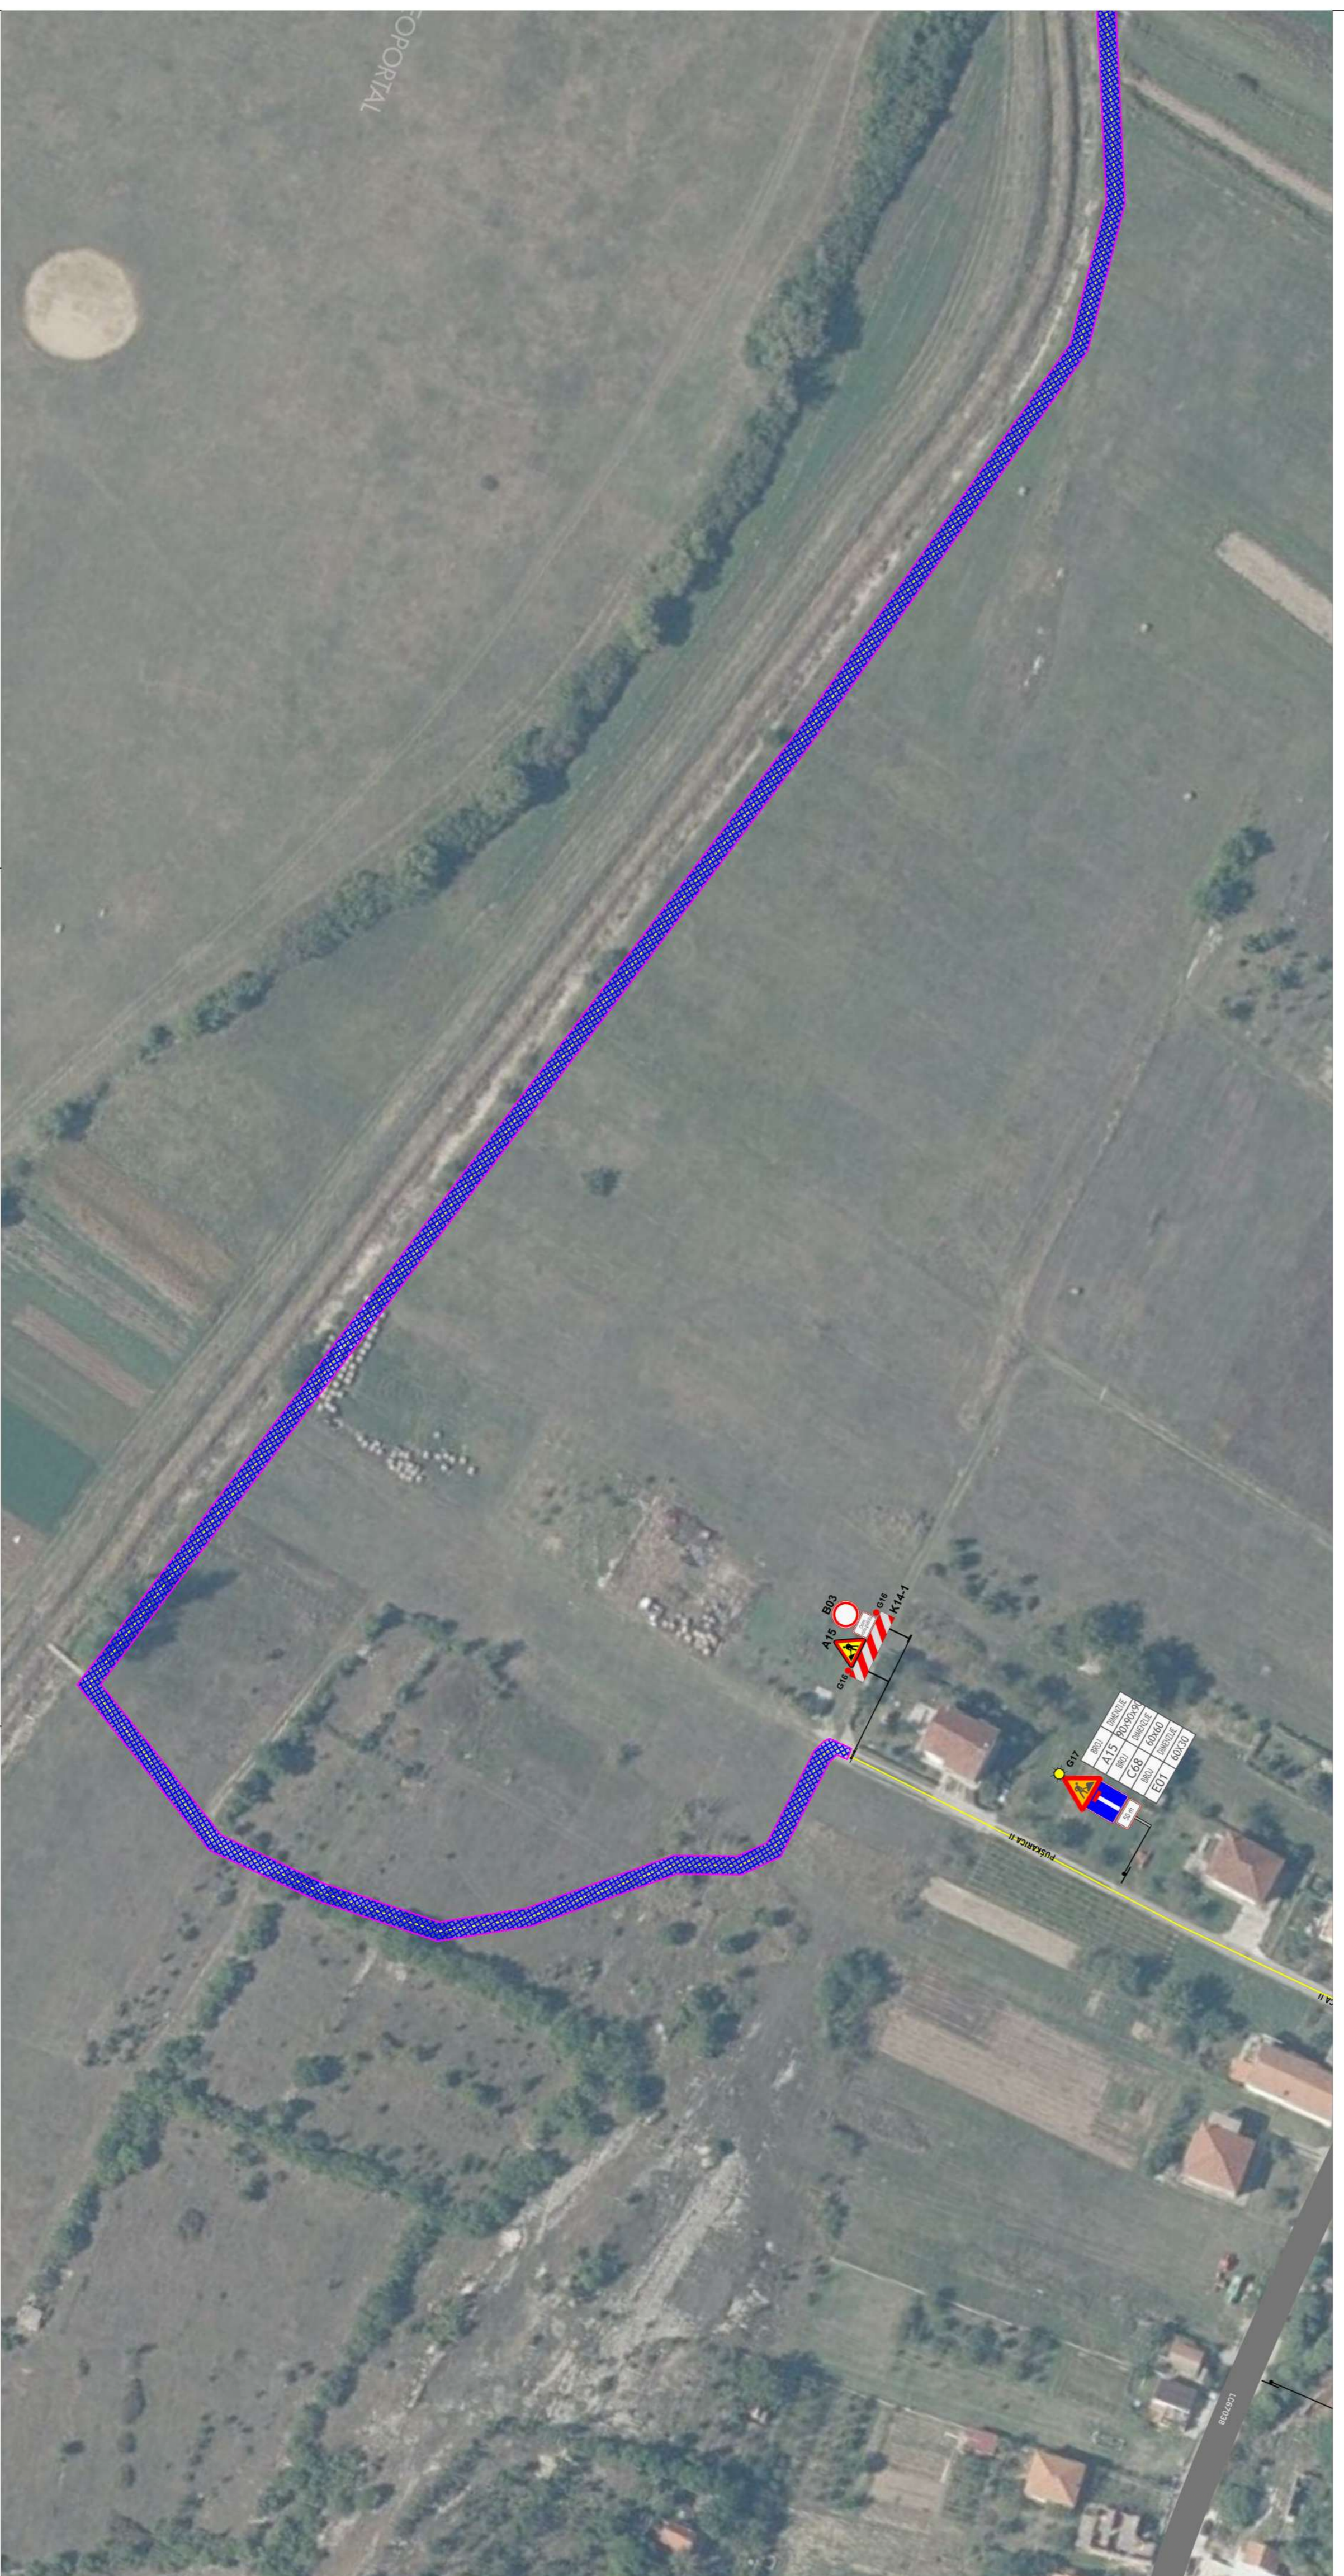

TOPORNA

OPIS: **LINEA PLEMA J.d.o.o.**
Selalište Bavlvice 8
21000 Split

INVESTITOR: **Vodovod i odvodnja Cestečke krajine d.o.o.**
 ZOB: **122.646.000**
 OIB: **3185682289**

GRABENIK: **Jure Granić**
 dipl. ing. prom.

PROJEKANT: **Jure Granić**
 dipl. ing. prom.

PROJEKAT: **PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"**

OPIS: **Situacija privremene regulacije prometa**
Etapa 2

PROJEKAT: **PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"**

PROJEKANT: **Jure Granić**
 dipl. ing. prom.

PROJEKAT: **PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"**

PROJEKANT: **Jure Granić**
 dipl. ing. prom.

PROJEKAT: **PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"**

PROJEKANT: **Jure Granić**
 dipl. ing. prom.

PROJEKAT: **PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"**

PROJEKANT: **Jure Granić**
 dipl. ing. prom.

PROJEKAT: **PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"**

PROJEKANT: **Jure Granić**
 dipl. ing. prom.

PROJEKAT: **PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"**

PROJEKANT: **Jure Granić**
 dipl. ing. prom.

PROJEKAT: **PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"**

PROJEKANT: **Jure Granić**
 dipl. ing. prom.

PROJEKAT: **PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"**

PROJEKANT: **Jure Granić**
 dipl. ing. prom.

PROJEKAT: **PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"**

PROJEKANT: **Jure Granić**
 dipl. ing. prom.

PROJEKAT: **PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"**

OPIS:	LINEA PLEMA J.d.o.o. Selalište Bavlvice 8 21000 Split		
INVESTITOR:	Vodovod i odvodnja Cestečke krajine d.o.o. 122.646.000 OIB: 3185682289		
GRABENIK:	Jure Granić dipl. ing. prom.		
PROJEKANT:	Jure Granić dipl. ing. prom.		
PROJEKAT:	PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"		
OPIS:	Situacija privremene regulacije prometa Etapa 2		
PROJEKANT:	Jure Granić	MEŠURLO:	1:1000
PROJEKAT:	PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"	GRTEŠ. br.:	3.2. list 1
PROJEKANT:	Jure Granić	DATAK:	srbanj, 2022
PROJEKAT:	PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"	KONTROLIRAO:	MP



LINIA PLENA J.d.o.o.
Šetalište Bačvice 8
21000 Švih

OIB: 79208453247
IBAN: HR17 2360000 1102872995

INVESTITOR: Vodovod i odvodnja četinske krajine d.o.o.
 126 Strigajde Hrvatske vojske 13
 OIB: 8168683289

OSNOVNA PROJEKTA: 179-PE-0922
ZOP:

GRADJEVNIK: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVODENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNICI 3 - 4"

VRSTA PROJEKTA: PROMETNI ELABORAT
RAZINA PROJEKTA: IZVEDBENI
STATUS: Situacija privremene regulacije prometa
 Etapa 2

PROJEKTANT: Jure Granić
 dipl. ing. posrn.


MERLO: 1:1000
CRTEŽ: 3.2. list 2
DATUM: svibanj, 2022

SURDONCI:

KONTROLA:
 M.P.





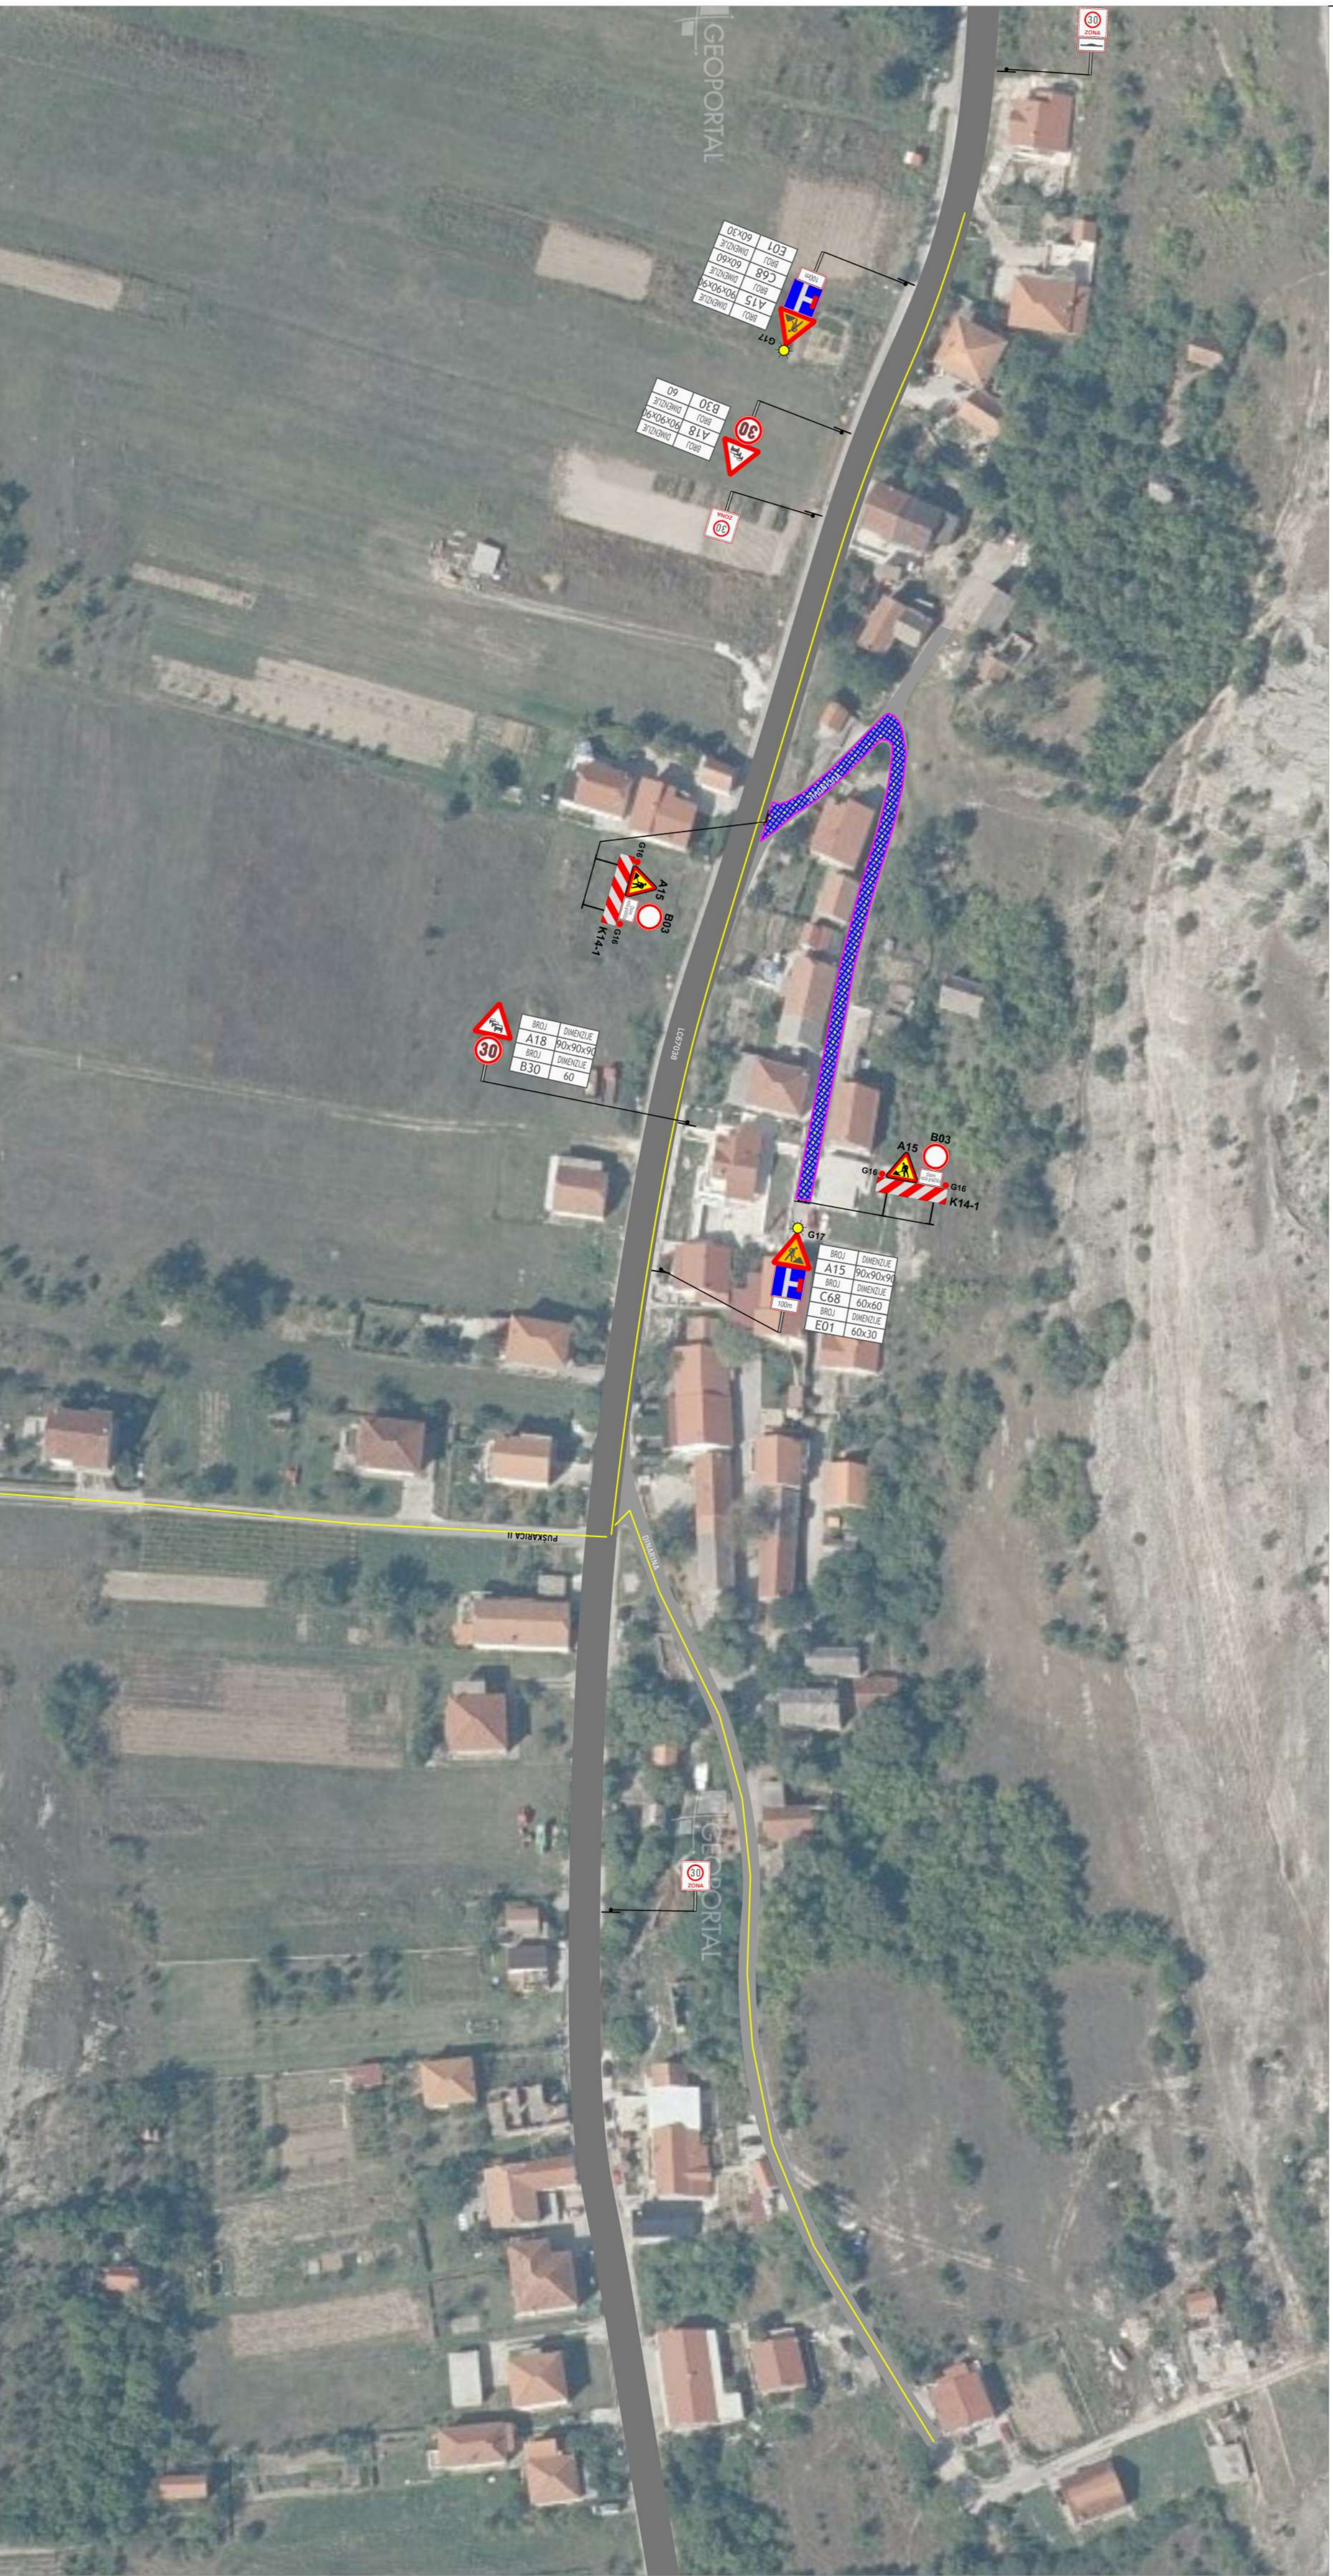








LINEA PLENA I.d.o.o. Štarišće Babičev 8 21000 Švihl OIB: 81658582389		OIB: 78208453247 IBAN: HR1723600001102872895	
INVESTITOR:	Vodovod i odvodnja Celinekne kraljeve d.o.o.	OPŠTINA PROJEKTA:	179-PE-05/22
GRADJEVNIK:	PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRLJEME IZVODENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODVORNIČE 3 - 4"	VRSTA PROJEKTA:	PROMETNI ELABORAT
PROJEKTANT:	Jure Granić dip.l. ing. prom.	RAZINA PROJEKTA:	IZVEDBENI
SURUDNICI:		SRODBU:	Situacija privremene regulacije prometa Etapla 3
		MAŠTALO:	1:1000
		CRTEŽIŠĆE:	3.3.
		DATUM:	svibanj, 2022
		KONTROLIRAO:	
		MP:	











LINEA PLEVA J.d.o.o. Sesalješte Bacišćica 8 21000 Špilj		OIB: 78209453247 IBAN: HR17 2360000 1102872895	
INVESTITOR:	Vodovod i odvodnja četinske krajine d.o.o.	OPŠTINA:	179-PE-0622
GRABERNIK:	21280 Špilj 21280 Sesalješte OIB: 81858823289	VRSTA PROJEKTA:	PROJEKTI ELABORAT
PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA NA KANALIZACIJSKIM KOLEKTORIMA PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD - "PODOVRNICE 3 - 4"		RAZINA PROJEKTA:	IZVEDBENI
PROJEKTANT:	Jure Granić Opšt. Ing. Prometa	ŠKOLJA:	Situacija privremene regulacije prometa Etapa 4
ŠIFRA:		BRZINA PROJEKTA:	IZVEDBENI
MERLO:	1:1000	DATAK:	svibanj, 2022
CRTEŽ:	3.4.	KONTROLIRAO:	
SIMBOL:		MP:	

Predmjer prometnih znakova i opreme












Etapa 1

 A15	4 komada	90X90X90 cm
 A18	2 komada	90X90X90 cm
 B03	2 komada	∅ 60 cm
 B30	2 komada	∅ 60 cm
 C68	1 komad	60X60 cm
 C68	1 komad	60X60 cm
 E01	2 komada	60X30 cm
 E05	2 komada	60X40 cm
 K14-1	2 komada	200X25 cm
 G16	4 komada	∅ 18 cm
 G17	2 komada	∅ 18 cm












Etapa 2

 A15	3 komada	90X90X90 cm
 B03	2 komada	∅ 60 cm
 C68	1 komad	60X60 cm
 E01	1 komad	60X30 cm
 E05	2 komada	60X40 cm
 K14-1	2 komada	200X25 cm
 G16	4 komada	∅ 18 cm
 G17	1 komad	∅ 18 cm

Etapa 3

 A15	4 komada	90X90X90 cm
 A18	2 komada	90X90X90 cm
 B03	2 komada	∅ 60 cm
 B30	2 komada	∅ 60 cm
 C68	1 komad	60X60 cm
 C68	1 komad	60X60 cm
 E01	2 komada	60X30 cm
 E05	2 komada	60X40 cm
 K14-1	2 komada	200X25 cm
 G16	4 komada	∅ 18 cm
 G17	2 komada	∅ 18 cm

Etapa 4

 A15	4 komada	90X90X90 cm
 A18	2 komada	90X90X90 cm
 B03	2 komada	∅ 60 cm
 B30	2 komada	∅ 60 cm
 C68	1 komad	60X60 cm
 C68	1 komad	60X60 cm
 E01	2 komada	60X30 cm
 E05	2 komada	60X40 cm
 K14-1	2 komada	200X25 cm
 G16	4 komada	∅ 18 cm
 G17	2 komada	∅ 18 cm
